

令和元年6月18日  
土木部道路課

## 都市計画道路補助115号線整備の進捗状況について

### 1 事業の概要

- 【名称】 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第115号線
- 【箇所】 江東区亀戸一丁目から大島二丁目
- 【規模】 事業延長482m 計画幅員20.0m（現況約6.0m）  
面積9,697.53㎡
- 【事業期間】 平成21年度～令和元年度

### 2 整備状況

- 平成30年度 道路改良（拡幅）工事（Ⅰ工区）完了
- 令和元年度 道路改良（拡幅）工事（Ⅱ工区）契約不調  
Ⅱ工区の契約不調により、事業スケジュールの見直しを行った結果、1年間の事業期間延伸を行うこととした。  
【変更後の事業期間】 平成21年度～令和2年度


### 3 今後の予定

- 令和元年度 道路改良（拡幅）工事（Ⅱ工区）※一部工事
- 令和2年度 道路改良（拡幅）工事（Ⅱ工区）※残工事

### 4 清水橋改修事業について

清水橋改修事業は、今年度工事発注予定であったが、都市計画道路補助115号線事業の遅れにより令和2年度の発注とした。

都市計画道路補助 115 号線 進捗状況

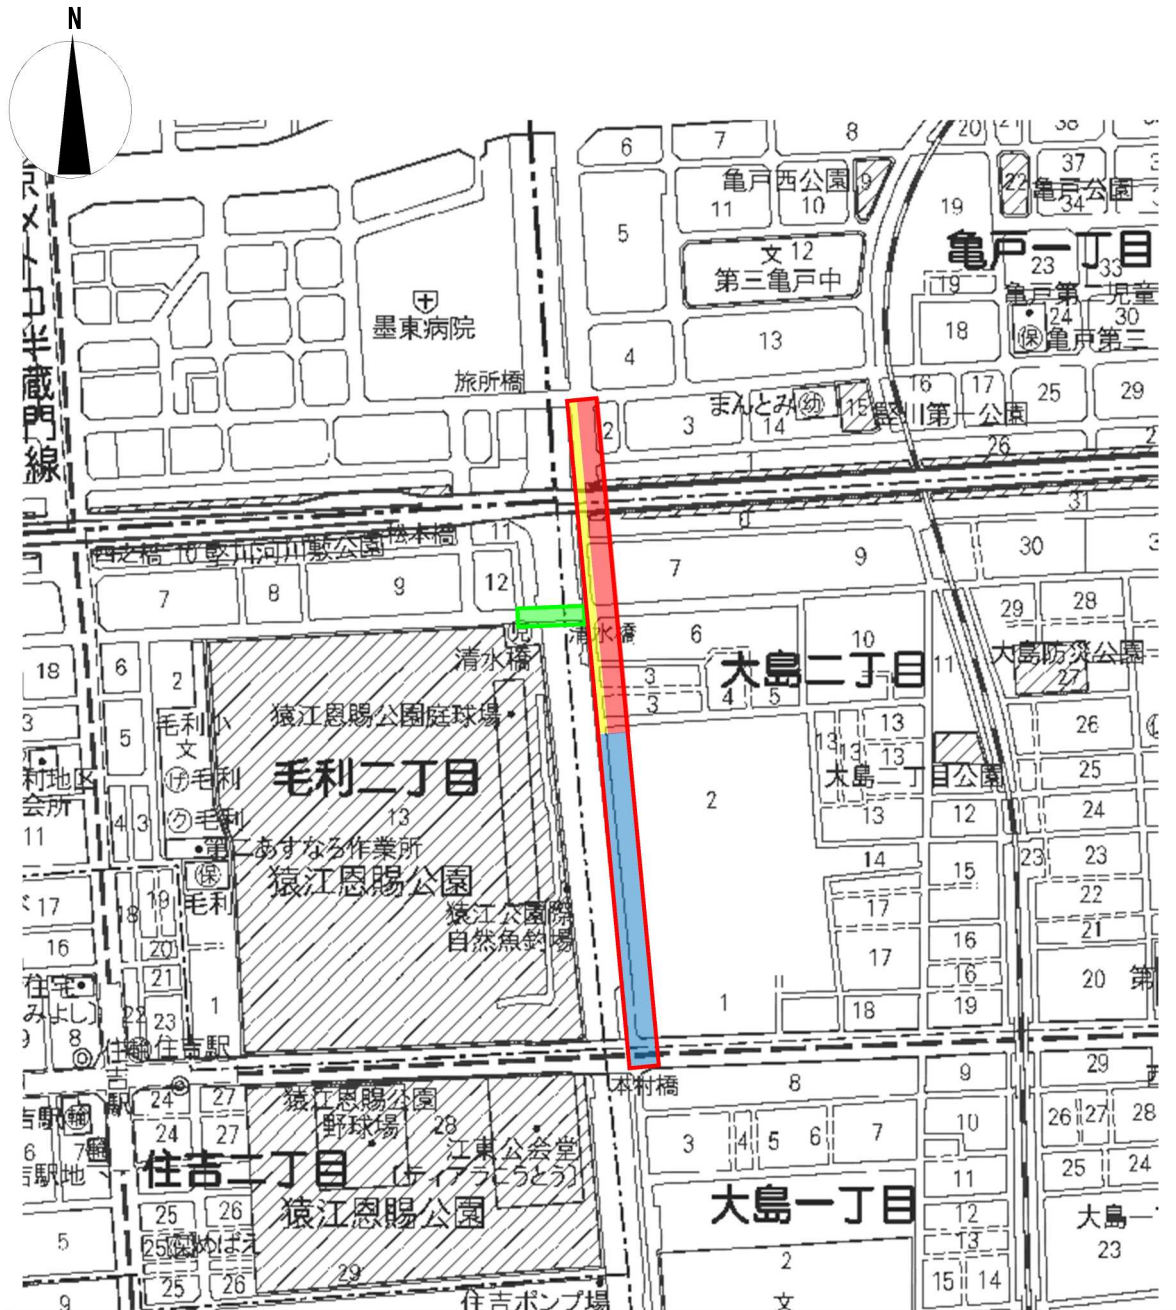

凡例

- 都市計画道路補助 115 号線整備範囲 (事業期間: H21~R2)
- I 工区範囲 (拡幅整備済み)
- II 工区範囲 (R1 施工予定)
- II 工区範囲 (R2 施工予定)
- 清水橋改修事業 (R2 事業開始予定)
