

令和3年6月17日
土木部道路課

都市計画道路補助115号線整備の進捗状況について

1 事業の概要

- 【名称】 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第115号線
- 【箇所】 江東区亀戸一丁目から大島二丁目
- 【規模】 事業延長482m 計画幅員20.0m（現況約6.0m）
面積9,697.53㎡
- 【事業期間】 平成21年度～令和3年度


2 整備状況

令和3年6月30日 道路改良工事完了予定

3 今後の予定

- 令和3年6月18日 車道相互通行開始、
両側歩道通行開始（一部区間除く）
- 令和3年9月～ 植栽工事
- 令和4年度 本村橋交差点（都道部）道路改良工事

4 進捗状況図

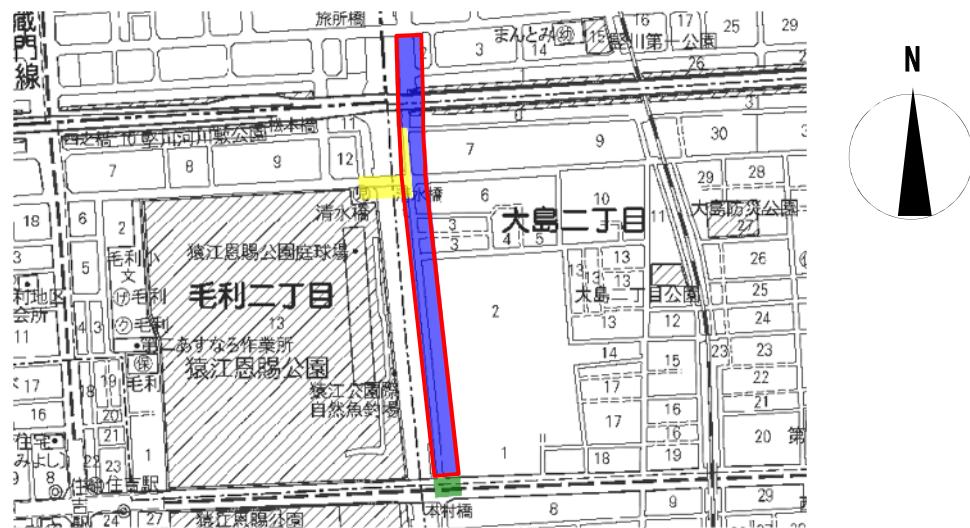

凡 例

- 都市計画道路整備範囲（事業期間：H21～R3年度）
- 拡幅整備済み、通行開始範囲
- 清水橋改修事業範囲（R2～R5年度）
- 本村橋交差点（都道部）施工範囲（R4年度）
