

## 巽橋架替工事（その1）工事における工期延伸のお知らせ

### お知らせ


日頃より工事へのご理解、ご協力を頂きまして、厚く御礼申し上げます。この度、巽橋架替工事（その1）において、以下のとおり**工期を延伸することとなりました**のでお知らせいたします。

### 工期の延伸理由


当初の計画では【図-1】のように永代一丁目側の道路に大型重機を配置するなど、道路から施工することを計画していました。しかし、警察協議等で道路上の大型重機の使用ができなくなったため、施工方法を改めて検討したところ、【図-2】のように河川上にステージを構築し、その上に重機を配置して施工をすることが必要となりました。

施工方法変更の検討及び変更に伴う関係機関協議が必要となったことによる現場着手時期の遅れや、当初の計画にはなかった河川上のステージ構築期間、仮締切（止水処理）の形状変更、大型重機1台での施工による施工性から工期の延伸が必要となりました。

【図-1】 道路上に重機を配置して施工

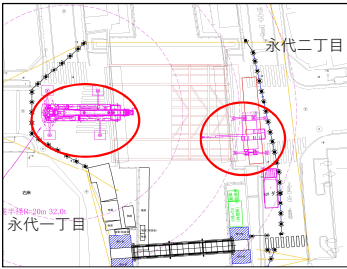

【図-2】 河川上にステージ構築し、重機を配置して施工

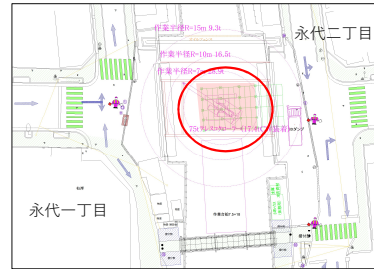

### 工事情報

工事件名 : 巽橋架替工事（その1）  
 工事期間 : 令和4年1月11日～令和5年5月20日（変更前）

↓  
 令和4年1月11日～**令和6年3月28日（変更後）**  
 （巽橋架替事業については、令和6年12月まで続く予定です。）

今回工事期間の延伸をいたしました。引き続き工期短縮への取り組みや警察協議を含む回路の再検討など、皆様へのご負担を1日でも早く解消できるよう工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

### 工事による影響について

車両通行止め : 令和4年1月11日～**令和6年12月（変更後予定）**  
 工事期間中は巽橋を車両通行止めにて作業を行うため、迂回のご協力をお願いいたします。また、歩行者および自転車につきましては仮人道橋より通行できます。

船舶通航止め : 令和4年1月11日～**令和6年9月（変更後予定）**  
 工事期間中は大島川西支川の巽橋付近を終日通航止めにて作業を行います。

### 今後のスケジュール

巽橋架替工事（その1）の工期延伸を踏まえた、巽橋架替事業の全体スケジュールは以下のとおりです。

巽橋架替工事 事業スケジュール

■ : 変更前    ■ : その1 工期延伸後

年度	R3												R4												R5												R6											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
その1	① ② ③ ④												④												③																							
その2																																																
その3																																																

① : 施工方法の変更検討及び変更に伴う関係機関協議  
 ② : 河川施工となったことによる河川占用物の撤去・補強など  
 ③ : 河川上のステージ構築及び撤去  
 ④ : 仮締切（止水処理）の変更による施工期間増  
 ←→ : 大型重機1台での施工となり、施工性が低下したことによる工期増加

事業完了予定

### 問い合わせ先

発注者 江東区土木部道路課橋梁係  
 担当：柳田 03-3647-9684

受注者 新日本・黒部建設共同企業体  
 担当：菱沼 080-3305-4604
