

令和3年6月14日  
総務部 経理課

### 工事契約状況調書

件名	異橋架替工事（その1）
1 工事場所	江東区永代一丁目～永代二丁目間大島川西支川に架かる
2 工事内容	別添のとおり
3 契約方法	一般競争入札
4 契約年月日	仮契約 令和3年5月14日
5 契約金額	672,320,000円
6 工期	本契約締結の日から令和5年5月20日まで
7 契約の相手方	東京都江東区佐賀一丁目11番11号

新日本・黒部建設共同企業体

代表者 会社名 新日本工業株式会社

代表取締役 小林 盛

会社名 黒部工業株式会社

代表取締役 吉田 博幸

### 8 構成員の経歴

(一) 第一グループ会社名 新日本工業株式会社

(1) 会社設立年月日 昭和43年4月10日

(2) 現在の資本金 1億円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高（橋りょう工事）

1億1,839万7,000円

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事（橋りょう工事）

件名 御船橋架替工事（その1）

発注者 江東区

請負金額 436,573,382円

（新日本・大蔵建設共同企業体・70%）

(5) 施工中の本区発注工事（橋りょう工事）

なし

(6) 令和2年度における本区発注の最高完成工事（橋りょう工事）

な し

(二) 第二グループ会社名 黒部工業株式会社

(1) 会社設立年月日 昭和42年12月5日

(2) 現在の資本金 3,000万円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高（橋りょう工事）

な し

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事（橋りょう工事）

な し

(5) 施工中の本区発注工事（橋りょう工事）

な し

(6) 令和2年度における本区発注の最高完成工事（橋りょう工事）

な し

9 出資割合 70%：30%

# 異橋架替工事 概要(全体)

## 1 目的

架設から約90年経過した異橋を対象に橋梁点検を実施した結果、大規模な改修や架替が検討された。

この結果、長寿命化修繕計画に基づき、周辺環境への負担や影響、また、施工性や経済性などから架替を実施するものである。

## 2 工期

令和3年7月～令和6年3月（令和3年度～令和5年度）

## 3 計画概要

橋梁形式 単純合成H桁橋

橋 長 16.0m

支 間 15.3m

総幅員 15.8m

有効幅員 14.0m（歩道2.5m+車道9.0m+歩道2.5m）

## 4 現況概要

橋梁形式 一径間下路式鋼鈹桁橋

橋 長 21.5m

支 間 19.812m

総幅員 17.892m

有効幅員 15.0m（歩道3.0m+車道9.0m+歩道3.0m）

## 5 工事概要

工事件名	工 種 概 要	工 期	状態
(その1)	下部工（仮人道橋・旧橋撤去・仮締切工・橋台工）	令和3年7月～ 令和5年5月	発注
(その2)	上部工（桁製作工・架設工・橋面工）	令和4年10月～ 令和5年9月	未発注
(その3)	取付道路工	令和5年7月～ 令和6年3月	未発注

# 工 事 概 要

工事件名：巽橋架替工事（その1）

工事箇所：江東区永代一丁目～永代二丁目間 大島川西支川に架かる

工 期：令和5年5月20日限り（令和3年度～令和5年度 3ヵ年債務負担工事）

工事内容：1 旧橋撤去工事

車両の通行止めをおこない、旧橋（上部、下部及び基礎の一部）の撤去をします。  
歩行者動線を確保のため仮人道橋を設置します。

## 2 下部工事


新橋台は、旧橋台を撤去後新たに構築し、既設の耐震護岸とつなぎ、構造の一体化を図ります。

### ※工程概要（予定）

工種	令和3年度												令和4年度												令和5年度				
	令和3年						令和4年						令和5年																
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月						
準備工	■	■	■	■																									
仮人道橋工					■																								
旧橋撤去工						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
仮締切工										■	■	■	■	■	■						■	■							
橋台工										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
片付け																						■							

# 案内図

異橋：江東区永代一丁目～永代二丁目間 大島川西支川に架かる

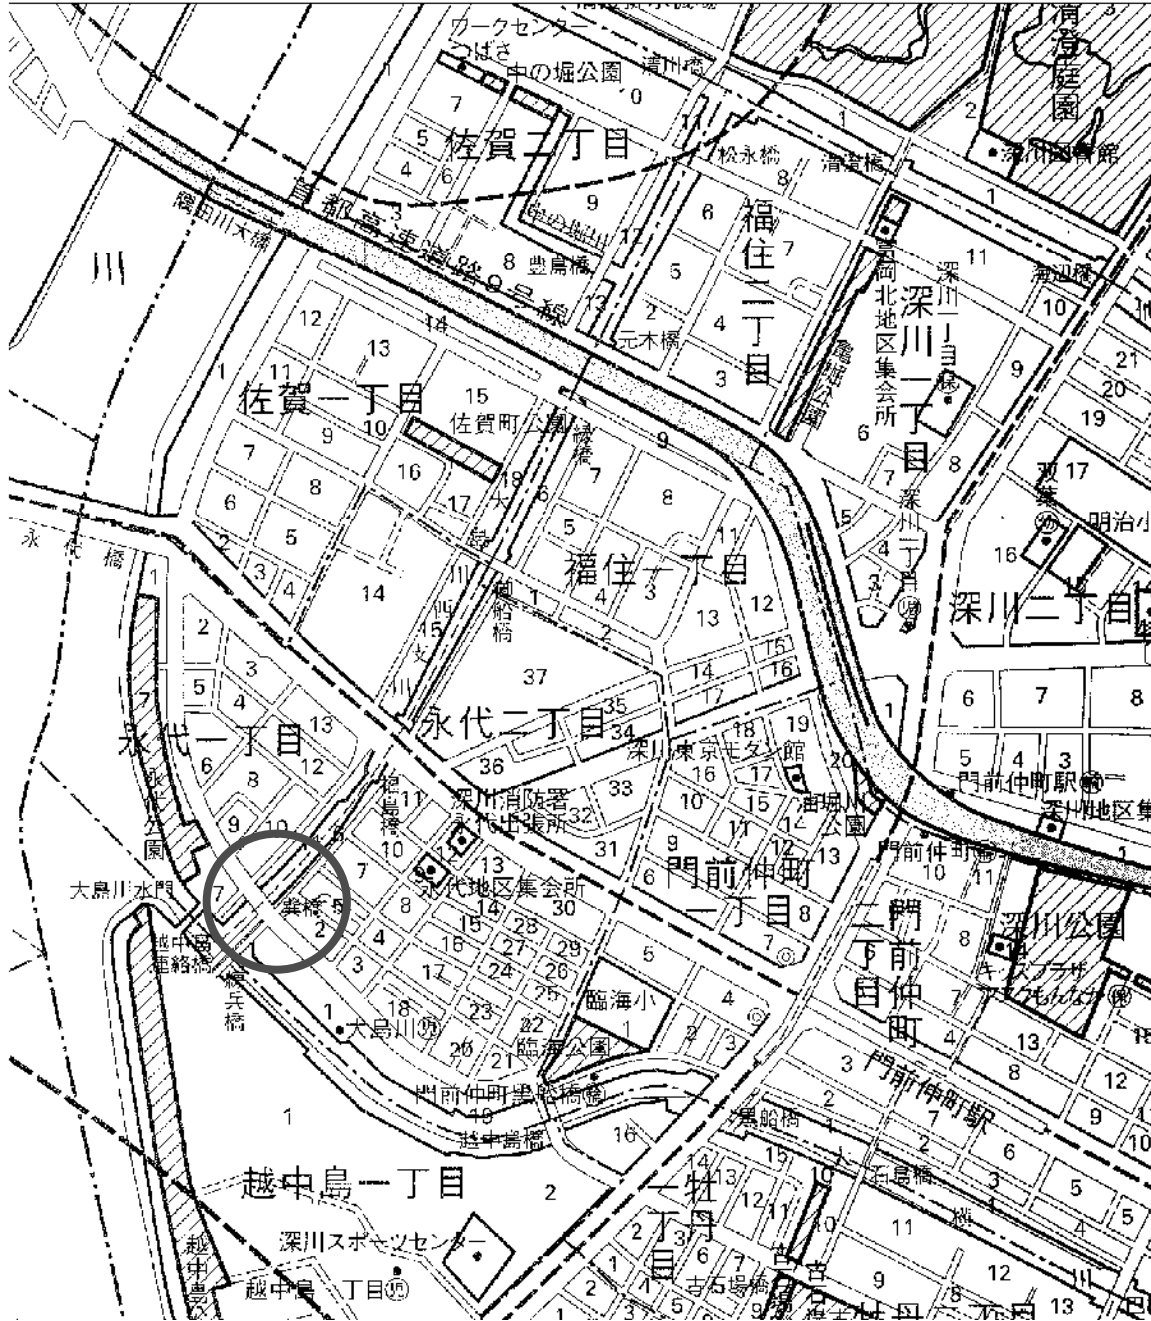

## 一般競争入札の結果

下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

### 記

- 1 件 名            巽橋架替工事（その1）
- 2 工事場所        江東区永代一丁目～永代二丁目間大島川西支川に架かる
- 3 工 期            令和5年5月20日まで
- 4 入札方法        制限付一般競争入札（総合評価方式）
- 5 内容説明        令和3年4月14日 設計図書送付による
- 6 開 札 日        令和3年5月14日 電子入札サービスによる

### 参加希望業者並びに入札結果

業者数	業 者 名	第 1 回					
		順位	金 額	施工能力 評価点	地域 貢献点	価格点	評価値
1	新日本・黒部建設共同企業体	1	円 611,200,000	14.35	4	0.005	18.355
2	大木・前田建設共同企業体	辞退	円	9	4.25	-	-
3	多田・CRS建設共同企業体	辞退	円	9	3.5	-	-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。  
 本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に100分の10に相当する金額を加算したものです。  
 なお、契約金額は672,320,000円(内消費税・地方消費税額61,120,000円)です。
